



ORDU ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2025

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	1
2. KURULUŞUN MEVCUT KAPASİTESİ	2
3. HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	6
II. PROJE BİLGİLERİ	6
1. GENEL BİLGİLER	6
2. SEKTÖR BAZINDA PROJE BİLGİLERİ.....	6
2.1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ:.....	6
2.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ:	7
2.3. DKH (SOSYAL) SEKTÖRÜ:.....	7
3. PROJE BAZINDA HARCAMA BİLGİLERİ.....	7
3.1. 2024H03-233002 / MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM SEKTÖRÜ).....	7
3.2. 2021H03-168407 / DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	18
3.3. 2024H03-233012 / YAYIN ALIMLARI	18
3.4. 2024H03-233017 / ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	21
3.5. 2020H03-152051 / KAMPÜS ALTYAPISI.....	22
3.6. 2024I00-227374 / MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK SEKTÖRÜ)	25
3.7. 2024K12-233956 / REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	25
III. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	26
IV. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO.....	27
V. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI PROJE BAZLI TABLO	28

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Projelerin Başlangıç ve Yılsonu Ödeneği	1
Tablo 2: Projelerin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı	1
Tablo 3: Açık ve Kapalı Hizmet Alanları (m ²)	3
Tablo 4: Arazilerin Mülkiyet Durumu.....	4
Tablo 5: Toplantı ve Konferans Salonları	4
Tablo 6: Yemekhane Sayıları.....	5
Tablo 7: Spor Tesisleri.....	5
Tablo 8: Bilgi Kaynakları Tablosu	5
Tablo 9: Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri.....	8
Tablo 10: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	8

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: Arazilerin Mülkiyet Durumu.....	4
Grafik 2: Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL).....	6
Grafik 3: Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri.....	8
Grafik 4: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	9
Grafik 5: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	18
Grafik 6: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	20



"En önemli ve verimli vazifelerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

K. Atatürk

SUNUŞ:

Ordu Üniversitesi olarak, akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi her geçen gün daha ileri taşıyarak, yerelden ulusala ve uluslararası düzeyde etkin bir rol üstlenmeyi temel hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Bilgi üreten, toplumsal kalkınmaya öncülük eden ve günün gereklerine uyum sağlayan dinamik bir yapıyla, öğrencilerimize ve topluma en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz.

Kurulduğu günden bu yana sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da lokomotif olma misyonunu üstlenmiş olan Üniversitemiz, bilimsel araştırma projeleri, uzman akademik kadrosu ve modern altyapı imkanlarıyla geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bu doğrultuda, en son teknolojik donanımlarla desteklenen bina, derslik ve laboratuvarlarımızda, öğrencilerimize en uygun eğitim-öğretim ortamını sunmayı hedeflemekteyiz.

Bu bağlamda, Üniversitemizin fiziksel altyapısının güçlendirilmesi ve akademik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilen yatırım bütçe ödenekleri, ilgili mevzuat çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bu kaynakların kullanımına ilişkin düzenli raporlar hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince hazırlanan 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, üniversitemizin gerçekleştirdiği yatırım faaliyetlerini ve bütçe kullanımını şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla sunarım.

Prof. Dr. Orhan BAŞ
Rektör

I. GENEL DEĞERLENDİRME

1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Yükseköğretim Kurumları arasında yer alan Üniversitemizin yatırımları; Hazine Yardımı ve Öz Gelir kaynaklarından finanse edilmektedir.

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin;

- ✓ Başlangıç ödeneklerini,
- ✓ Yıl sonu toplam ödeneklerini,
- ✓ Finansmanı kaynaklarını,

gösteren bilgilerin yer aldığı tablolar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1: Projelerin Başlangıç ve Yılsonu Ödeneği

Sektör / Alt Sektör	Adet	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	5	75.000.000	67.500.000
SAĞLIK / SAĞLIK	1	8.000.000	8.000.000
DKH-SOSYAL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	1	832.000	832.000
TOPLAM	7	83.832.000	76.332.000

Tablo 2: Projelerin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

Sektör / Alt Sektör	Adet	Hazine Yardımı	Öz Gelir
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	5	75.000.000	-
SAĞLIK / SAĞLIK	1	8.000.000	-
DKH-SOSYAL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	1	-	832.000
TOPLAM	7	83.000.000	832.000

2. KURULUŞUN MEVCUT KAPASİTESİ

Ordu Üniversitesi kampüs alanı olarak 20.09.2007 tarihli tutanak ile Cumhuriyet Mahallesiindeki mülkiyeti Karadeniz Teknik Üniversitesi ve şahıslara ait yaklaşık 400 dönümlük arazinin belirlenmesine karar verilmiştir. Bu arazinin KTÜ'ye ait olan kısmı daha sonra Ordu Üniversitesine devredilmiştir. Kampüs alanı Üniversite Senatosunun 18.07.2007 tarih ve 6 no'lu oturumunda alınan 2007/34 sayılı Karar ile “Cumhuriyet Kampüsü” adını almıştır.

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kanunla Ordu Üniversitesi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı; Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fatsa Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulları ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı; Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur.

Ayrıca kurulduğu günden bu zamana kadar mevcut okullara aşağıdaki okullarda dahil edilmiştir.

Tıp Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi,
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
Diş Hekimliği Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi,
Turizm Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Spor Bilimleri Fakültesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu,
Ulubey Meslek Yüksekokulu,
Akkuş Meslek Yüksekokulu,
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
İkizce Meslek Yüksekokulu,
Gölköy Meslek Yüksekokulu,
Aybastı Meslek Yüksekokulu,
Perşembe Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi.

Ordu Üniversitesi, içerisinde rektörlük idari birimleri ve akademik birimlerin olduğu Cumhuriyet Yerleşkesine ilave olarak Altınordu ilçesinde bulunan 4 yerleşke ve diğer ilçelerde bulunan 10 yerleşke ile toplam 14 ayrı yerleşkede içerisinde 157.554 m² kapalı alanın bulunduğu 1.154.528 m² açık alanda eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.


Tablo 3: Açık ve Kapalı Hizmet Alanları (m²)		
Birim Adı	Kapalı Alan	Açık Alan
Rektörlük	13.570	1.154.528
Yabancı Diller Yüksekokulu - Eğitim ASM	5.135	
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok	8.320	
Fen Edebiyat Fakültesi B Blok + İlahiyat Fakültesi	7.471	
Ziraat Fakültesi + Sağlık Bilimleri Fakültesi	13.538	
Diş Hekimliği Fakültesi	14.658	
Eğitim Fakültesi + Güzel Sanatlar Fakültesi	11.433	
Spor Bilimleri Fakültesi	9.060	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.347	
Morfoloji Binası	16.052	
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi	11.466	
Mesudiye Meslek Yüksekokulu	932	
Ünye Meslek Yüksekokulu	4.317	
Fatsa Meslek Yüksekokulu	2.213	
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi	3.445	
Ulubey Meslek Yüksekokulu	1.227	
Akkuş Meslek Yüksekokulu	1.175	
İkizce Meslek Yüksekokulu	3.857	
Aybastı Meslek Yüksekokulu	470	
Gölköy Meslek Yüksekokulu	1.050	
Turizm Fakültesi	1.932	
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	4.120	
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	7.013	
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.356	
Turizm Uygulama Restoranı	396	
Kafeterya + Soyunma odaları	410	
Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi	3.760	
Kreş	1.642	
Sosyal Yaşam Merkezi	189	
Toplam Alan	157.554	1.154.528

Ordu Üniversitesinin taşınmaz varlıklarının yerleşke bazında; üniversite, hazine ve diğer arazilere göre dağılımını gösteren Tablo 4 aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: Arazilerin Mülkiyet Durumu

Yerleşke Adı	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam
Cumhuriyet Yerleşkesi	689.325	-	-	689.325
Akkuş Yerleşkesi	-	17.581	-	17.581
Aybastı Yerleşkesi	470	-	-	470
Altınordu Yerleşkesi	60.804	19.842	-	79.949
Fatsa Yerleşkesi	410	131.858	-	132.268
Gölköy Yerleşkesi	1.050	-	-	1.505
Gülyalı Yerleşkesi	6.769	-	-	6.769
İkizce Yerleşkesi	4.128	-	-	4.128
Kumru Yerleşkesi	6.709	-	-	6.709
Mesudiye Yerleşkesi	-	15.403	-	15.403
Ulubey Yerleşkesi	8.916	7.541	-	16.457
Ünye Yerleşkesi	9.630	8.134	165.958	183.722
TOPLAM	788.211	200.359	165.958	1.154.528

Grafik 1: Arazilerin Mülkiyet Durumu

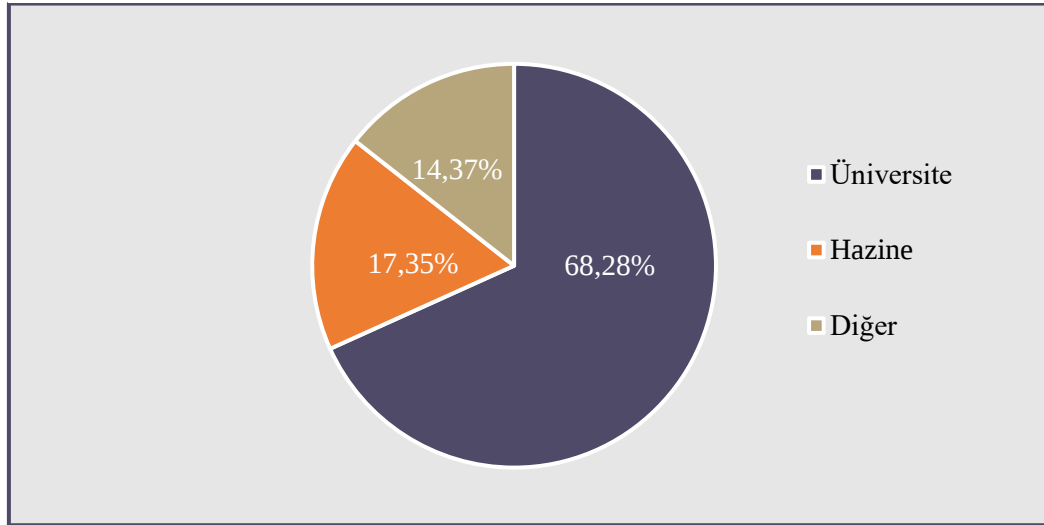

Tablo 5: Toplantı ve Konferans Salonları

Kapasite	Adet	Alan (m ²)
0 – 50 kişi	20	730
51 – 75 kişi	11	456
76 – 100 kişi	4	306
101 – 150 kişi	3	472
151 – 250 kişi	5	953
251 kişi ve üzeri	2	2.045
Toplam	45	4.962

Tablo 6: Yemekhane Sayıları

Yerleşke Adı	Adet	Alan (m ²)	Kapasitesi
Cumhuriyet Yerleşkesi	4	1.750	1.330
Akkuş Meslek Yüksekokulu	2	140	54
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi*	2	150	150
İkizce Meslek Yüksekokulu	2	120	94
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	2	250	154
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2	270	220
Turizm Fakültesi	1	55	40
Ulubey Meslek Yüksekokulu	2	110	50
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	2	588	356
Ünye Meslek Yüksekokulu	2	300	160
Toplam	21	3.733	2.608

*Fatsa MYO ile ortak kullanılmaktadır.

Tablo 7: Spor Tesisleri

Yerleşke Adı	Açık Alan	Kapalı Alan	Adet	Alan (m ²)
Cumhuriyet Yerleşkesi	3	1	4	6.369
Akkuş Meslek Yüksekokulu	1	-	1	350
Fatsa Yerleşkesi	3	-	3	2.167
İkizce Meslek Yüksekokulu	1	-	1	540
Mesudiye Meslek Yüksekokulu	1	-	1	540
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	-	1	510
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3	-	3	1.972
Ulubey Meslek Yüksekokulu	1	-	1	120
Ünye Yerleşkesi	2	1	3	3.809
Toplam	16	2	18	16.377

Tablo 8: Bilgi Kaynakları Tablosu

Tür	Sayı
Basılı Kitap Sayısı	97.546
Katalogsuz Kitap Sayısı	0*
Elektronik Kitap Sayısı (Abone Olunan)	1.810.568
Elektronik Kitap Sayısı (Satın Alınan)	21.952
Basılı Süreli Yayın Sayısı	7.884
Elektronik Süreli Yayın Sayısı (Abone Olunan)	203.031
Toplam	2.140.981

*Kataloglama çalışmaları tamamlanarak tüm materyaller kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

3. HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2024 yılı içerisinde tamamlanarak taşınmaz malların kapasitesinde (açık ve kapalı alan m²) artışa neden olabilecek herhangi bir yatırım projesi bulunmamaktadır.

II. PROJE BİLGİLERİ


1. GENEL BİLGİLER

2024 Yılı Yatırım Programında Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 5 tanesi Eğitim Sektörü, 1 tanesi Sağlık Sektörü, 1 tanesi de DKH(Sosyal) Sektöründe olmak üzere toplam 7 tanedir.

Üniversitemize 2024 Yılı Yatırım Programında yılı ödeneği olarak kamulaştırma dâhil 83.832.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizeler sonucunda ödenek tutarı kamulaştırma dâhil 76.332.000 TL olmuştur.

Revize ödeneğin kamulaştırma dâhil 52.854.785 TL'si harcanmış olup %69,24 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Grafik 2: Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL)

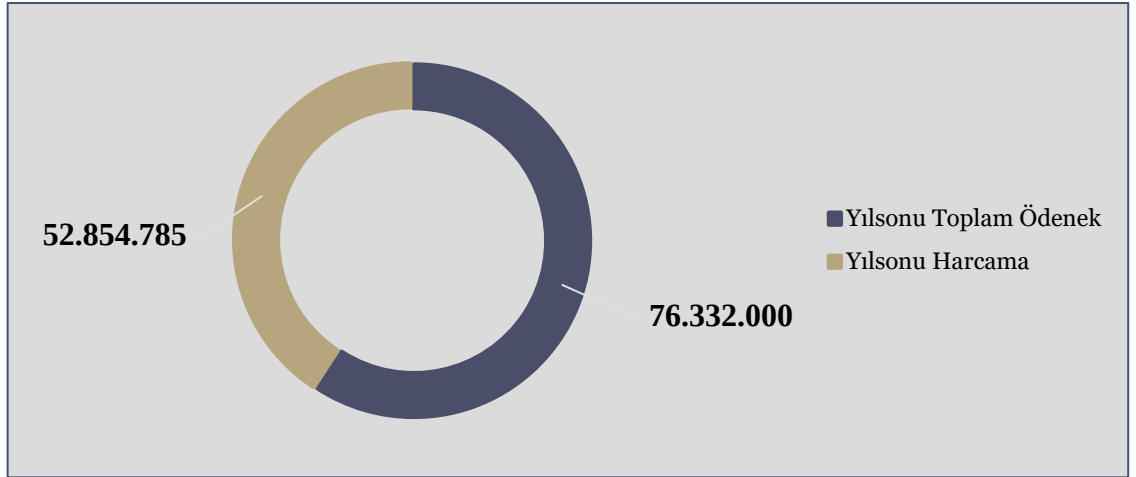

2. SEKTÖR BAZINDA PROJE BİLGİLERİ

2.1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 5 tanesi Eğitim Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numaraları ve Adları

- ✓ 2024H03-233002 / Muhtelif İşler Projesi
- ✓ 2021H03-168407 / Derslik ve Merkezi Birimler
- ✓ 2024H03-233012 / Yayın Alımları
- ✓ 2020H03-152051 / Kampüs Altyapısı
- ✓ 2024H03-233017 / Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Hazine yardımı ile yürütülen eğitim sektörü projeleri kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 75.000.000 TL başlangıç ödeneğinin 46.309.261,31 TL'si harcanmış olup %61,75 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yayımlanmasına müteakip eğitim sektöründen 7.500.000 TL tutarındaki ödenek yedeğe aktarma bütçe işlemi yapılarak aktarılmıştır. Yapılan bu aktarma sonrasında toplam ödenek 67.500.000 TL olarak gerçekleşmiş olup, nakdi gerçekleşme oranı ise %68,60 olarak gerçekleşmiştir.

2.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 1 tanesi Sağlık Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numarası ve Adı

✓ 2024I00-227374 / Muhtelif İşler Projesi

Hazine yardımı ile yürütülen bir proje olup, bu kapsamda Üniversitemize tahsis edilen 8.000.000 TL başlangıç ödeneğinin 6.545.523,44 TL'si harcanmıştır. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ya da aktarma işlemi yapılmamış olup nakdi gerçekleşme oranı %81,82 olarak gerçekleşmiştir.

2.3. DKH (SOSYAL) SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 1 tanesi DHK (Sosyal) Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numarası ve Adı

✓ 2024K12-233956 / Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanan yatırım projesi için Üniversitemize tahsis edilen 832.000 TL kesintili başlangıç ödeneğinden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ya da aktarma işlemi yapılmamış olup nakdi gerçekleşme oranı %0 olarak gerçekleşmiştir.

3. PROJE BAZINDA HARCAMA BİLGİLERİ

3.1. 2024H03-233002 / MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM SEKTÖRÜ)


Muhtelif İşler Projesi toplu proje olup karakteristiğinde; Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Makine Teçhizat alımları yer almaktadır.

2024 yılı başlangıç ödeneği 43.800.000 TL'dir. Yıl içerisinde 200.000 TL aktarma bütçe işlemleri yapılarak toplam proje ödeneği 44.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 28.539.378 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %64,86 olarak gerçekleşmiştir. Proje ödeneği hazine yardımından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin karakteristiğine göre başlangıç ve yılsonu ödeneklerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir.


Tablo 9: Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri

Karakteristik Özelliği	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
Bakım Onarım	25.300.000	20.100.000	15.611.938
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	5.500.000	4.029.000	3.687.162
Makine Teçhizat Alımları	13.000.000	19.871.000	9.240.278
Toplam	43.800.000	44.000.000	28.539.378

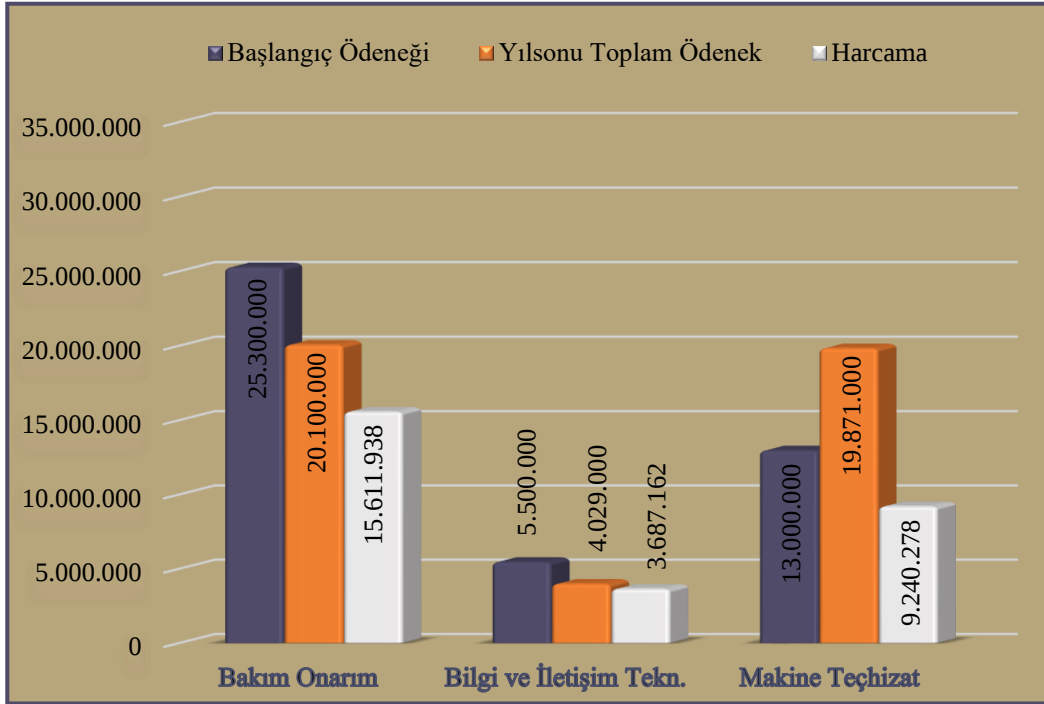Grafik 3. Karakteristik Özelliklerine Göre Ödenek Bilgileri**Tablo 10: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı**

Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama
06.01	Mamul Mal Alımları	13.000.000	19.871.000	9.240.278
06.03	Gayrimaddi Hak Alımları	5.500.000	4.029.000	3.687.162
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	2.500.000	2.700.000	1.532.270
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.800.000	17.400.000	14.079.668
Toplam		43.800.000	44.000.000	28.539.378

Grafik 4. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

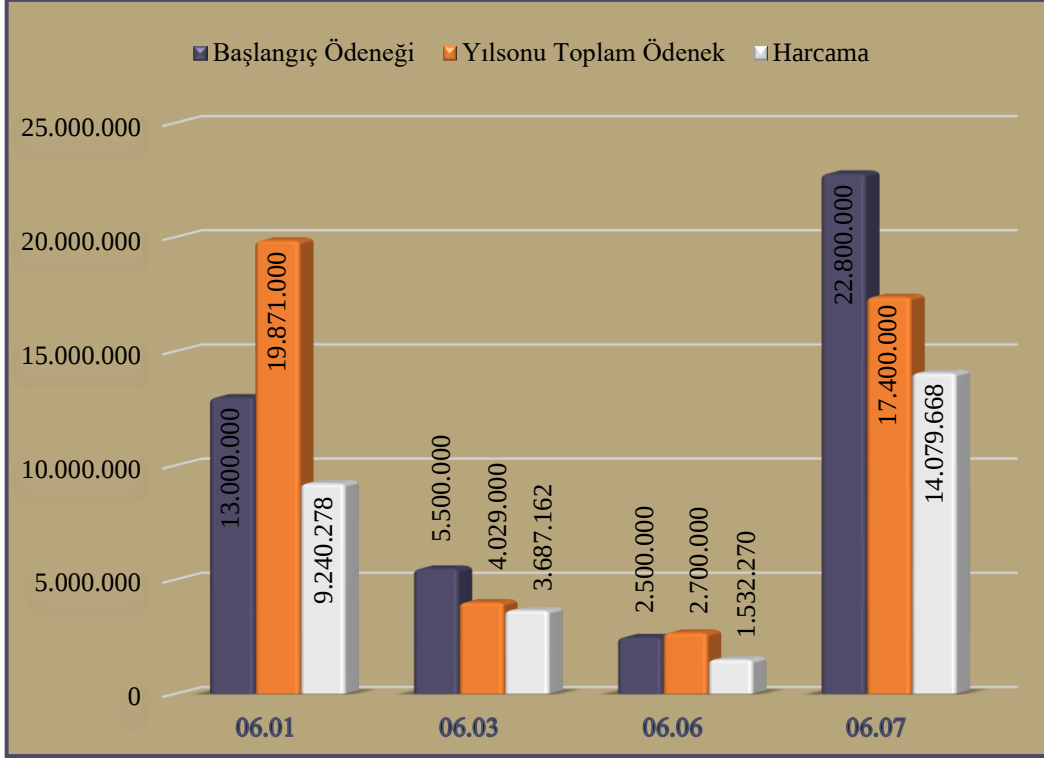

Yatırım harcamaları ekonomik kod bazında değerlendirildiğinde harcamalar içerisinde en büyük pay %49,33 oran ile “06.07-Mamul Mal Alımları” ekonomik koduna aittir.

En küçük pay ise %5,36 ile “06.06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri” ekonomik koduna aittir.

“06.03-Gayrimaddi Hak Alımları” kapsamında 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla ödenek 4.029.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam proje ödenekleri içerisindeki payı %9,16’dır.

“06.01- Mamul Mal Alımları” kapsamında ise 13.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla ödenek 19.871.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam proje ödenekleri içerisindeki payı %45,16 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Kapsamında Yapılan Başlıca İşler

Akademik ve idari birimlerden gelen talepler değerlendirilerek bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaya çalışılmıştır. Yapılan faaliyetlerin işin karakteristik özelliklerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Makine Teçhizat Alımları

Elektronik ve Bilişim Ekipmanları

- Masaüstü bilgisayar ve monitör alımı

- Notebook alımı
- Dizüstü bilgisayar (PC) alımı
- Lazer yazıcı alımı
- Yazıcı cihazları alımı
- Projeksiyon cihazı alımı
- Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazları alımı
- Anahtarlama cihazı (Switch) alımı
- Bullet Kamera ve 8 Port Switch alımı
- Network kayıt cihazı alımı
- Dijital video kayıt cihazı alımı
- Kamera ve güvenlik disk alımı

Ofis ve Mobilya Malzemeleri

- Çalışma koltuğu alımı
- Bilgisayar masası alımı
- Konferans sandalyesi alımı
- Masa ve sandalye alımı
- Dosya dolabı alımı
- Çelik raf ana modül alımı
- Yazı tahtası alımı
- Atatürk portresi alımı

Güvenlik ve Kontrol Sistemleri

- Turnike alımı
- Güvenlik sebebiyle turnike alımı
- Güç kaynağı ve kayıt cihazı alımı
- Güvenlik amirliği için malzeme alımı

Temizlik ve Çevre Düzenleme Ekipmanları

- Ahşap çöp kovası alımı
- Kâğıt imha makinesi alımı

Ses ve Görüntü Sistemleri

- Ses sistemi ve el telsizi (3'lü) alımı
- Projeksiyon cihazı alımı

Ev ve Mutfak Ekipmanları

- Buzdolabı alımı
- Buharlı pres ütü alımı
- Çamaşır yıkama ve kurutma makinesi alımı
- Klima alımı

Bahçe ve Bakım Araçları

- Benzinli üfleme makinesi alımı
- Sırt motoru ve budama motoru alımı
- Üfleme ve toplama makinesi alımı

Diğer Malzeme Alımları

- Ölçü bastonu alımı
- Paslanmaz çelik bayrak direği alımı
- Perde alımı bedeli
- Kazan alımı

Üniversite Birimleri İçin Özel Alımlar

- Ordu Üniversitesi UZEM için stüdyo malzemesi alımı
- Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi için dolap alımı
- Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü için yaka mikrofonu ve konferans kamerası alımı
- Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı için malzeme alımı kredi bedeli

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Yazılım ve Lisans Alımları

- e-Kamu İşçi Modülü lisans alımı
- Veri yönetim yazılımı alımı
- 1500 kullanıcı 3 yıllık mail güvenlik yazılımı lisans yenileme alımı
- İstatistik yazılımı alımı
- Sanallaştırma yazılımı yenileme lisans alımı
- Microsoft lisans alımı

Sistem ve Güvenlik Çözümleri

- SIEM Log Toplama ve Korelasyon Sistemi Lisansı (100 Kaynak) alımı
- Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Birimi için Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yazılımı kurulumu

Bakım Onarım

Menkul Malların Bakım ve Onarım İşleri

- Su arıtma cihazları için yedek parça ve filtre alımı
- Fotokopi makineleri için yedek parça ve bakım hizmetleri
- Yer temizleme makineleri için yedek parça alımı
- Distile su cihazı için yedek parça alımı
- Çeşitli laboratuvar malzemeleri ve bakım hizmetleri
- Telefon santrallerinin bakım ve onarım hizmetleri
- Otomatik kapılar için bakım ve onarım hizmetleri
- Klima montajı ve bakımı
- VRF dış üniteleri bakım hizmetleri
- Jeneratörlerin bakım ve onarım hizmetleri
- Kalorifer tesisatına ait cihazların bakımı
- İklimlendirme cihazlarının periyodik bakım hizmetleri
- 2024 yılı Fen Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük binası çeşitli tesisat arızalarının giderilmesi işi
- 2024 yılı mekanik tesisat çeşitli arızaların giderilmesi işi
- 2024 yılı Cumhuriyet Yerleşkesi hidrofor gruplarının bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işi
- 2024 yılı Rektörlük binası muhtelif mekanik ve elektrik işlerinin yapılması

Gayrimenkul Malların Bakım ve Onarım İşleri

Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Bakım ve Onarımı

- Üniversite geneli muhtelif elektrik işleri
- Ziraat Fakültesi, Eski Rektörlük Binası ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi muhtelif elektrik işleri
- Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 yılı mekanik ve elektrik işleri

- 2024 yılı Rektörlük Binası VRF sistemi bakım ve onarım işi
- 2024 yılı 2. etap mekanik tesisat çeşitli arızaların giderilmesi işi

Bina ve Yapısal Onarımlar

- Asansörlerin 2024 yılı periyodik bakım işleri
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi yangın merdiveni bakım ve onarım işi
- Ziraat Fakültesine bağlı uygulama alanındaki 4 adet sera kapısının yükseltilmesi işi
- Eğitim Fakültesi açık hava dersliği yapılması işi
- Güzel Sanatlar Fakültesi oda bölünmesi işi
- Mesudiye Meslek Yüksekokulu çatı onarım işi
- Cumhuriyet Yerleşkesi B Kapısı güvenlik kulübesi yapımı
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu güvenlik kulübesi çevre düzenleme işi
- UZEM Stüdyo Odası çelik konstrüksiyon ızgara yapımı
- Gölköy Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarı tesisat işleri


Büyük Onarım ve Yenileme Çalışmaları

- Ünye İİBF 2024 yılı büyük onarım işleri
- Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 yılı büyük onarım işleri
- Mesudiye Meslek Yüksekokulu jeneratör onarım işi
- Kademe Birimine malzeme alım işleri

Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 Yılı Mekanik ve Elektrik İşleri




Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 Yılı Büyük Onarım İşi

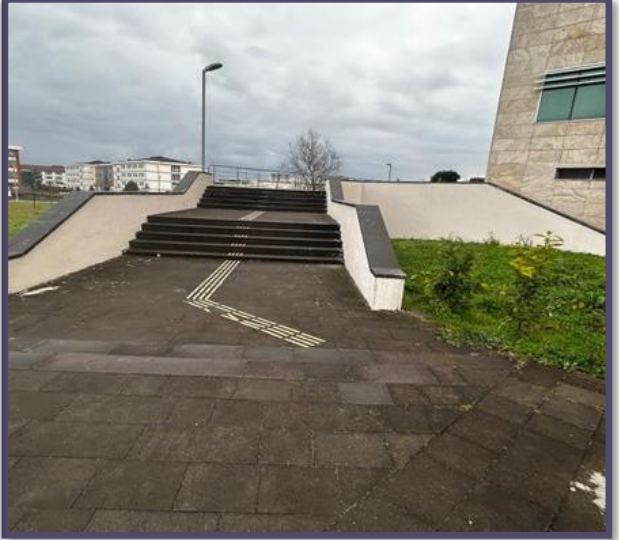

Ünye İİBF 2024 Yılı Büyük Onarım İşi



Sosyal Bilimler MYO Güvenlik Kulübesi Çevre Düzenleme İşi

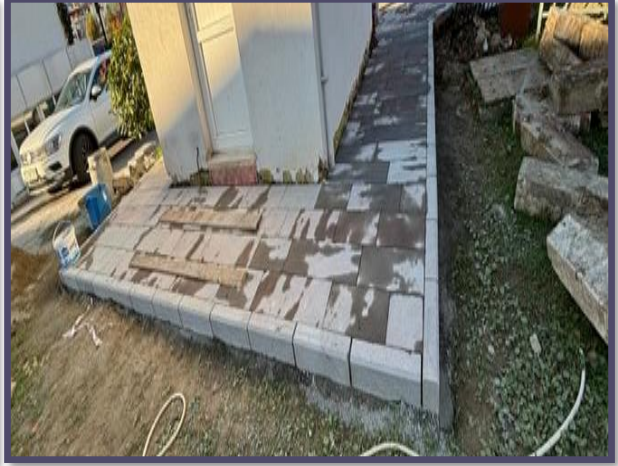

Mesudiye MYO Çatı Onarım İşi



Cumhuriyet Yerleşkesi B Kapısı Güvenlik Kulübesi Yapılması İşi



UZEM Stüdyo Odası Çelik Konstrüksiyon Izgara Yapılması İşi



Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Bölünmesi İşi



3.2. 2021H03-168407 / DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

İlahiyat Fakültesi binası, 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan bir alt proje olarak yer almaktadır. 2024 yılı yatırım programında projenin bitiş tarihi 2026 olarak öngörülmüştür. Ancak 2025 yılı itibarıyla proje süresi 2027 yılına uzatılmıştır.

Binaya ait uygulama projeleri ve ihale dokümanları 2021 yılında hazırlanmış, yapım işinin yaklaşık maliyeti 2022 yılı birim fiyatlarıyla güncellenerek 15 Mart 2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Ancak tekliflerin beklenen maliyetin çok üzerinde olması ve yeterli rekabetin sağlanamaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 5 Temmuz 2022 tarihinde yeniden ihale yapılmış, ancak teklif veren firma olmamıştır. 2 Ağustos 2022 tarihinde proje bütçesi 111 milyon TL olarak güncellenmiş ve 27 Eylül 2022 tarihinde üçüncü kez ihaleye çıkmıştır. Ancak yine teklif gelmemesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

27 Aralık 2022 tarihinde yapılan dördüncü ihalede, gelen tekliflerin maliyetin üzerinde olması nedeniyle süreç tamamlanamamış ve bu durum 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan beşinci ihalede de tekrar edilmiştir. Bu süreçte proje bütçesi 191,75 milyon TL olarak güncellenmiş olsa da gelen tekliflerin yine yüksek olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan revizyon talebi sonrasında proje bütçesi 195 milyon TL olarak güncellenmiş ve kapalı alanı 6.500 m² olarak belirlenmiştir. Bu revizyon doğrultusunda yeni uygulama projelerine ihtiyaç duyulmuş ve 17 Temmuz 2024 tarihinde projelerin ihalesi gerçekleştirilerek belirlenen süre içerisinde uygulama projeleri tamamlanmıştır.


2025 yılı yatırım programında proje tutarı 292,5 milyon TL olarak güncellenmiş ve bu yıl için ayrılan ödenek 29,85 milyon TL olarak belirlenmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde yapım işi ihalesine yeniden çıkılacak olup proje süresinin 2027 yılına uzatılmasıyla birlikte yatırım projesinin planlanan süre zarfında tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

3.3. 2024H03-233012 / YAYIN ALIMLARI

Yayın Alımları Projesi müstakil bir proje olup karakteristiğinde; Basılı Yayın Alımı ve Elektronik Yayın Alımları yer almaktadır.

2024 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL'dir. Toplam ödeneğin %99,91'i harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımından finanse edilmektedir.

Grafik 5. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

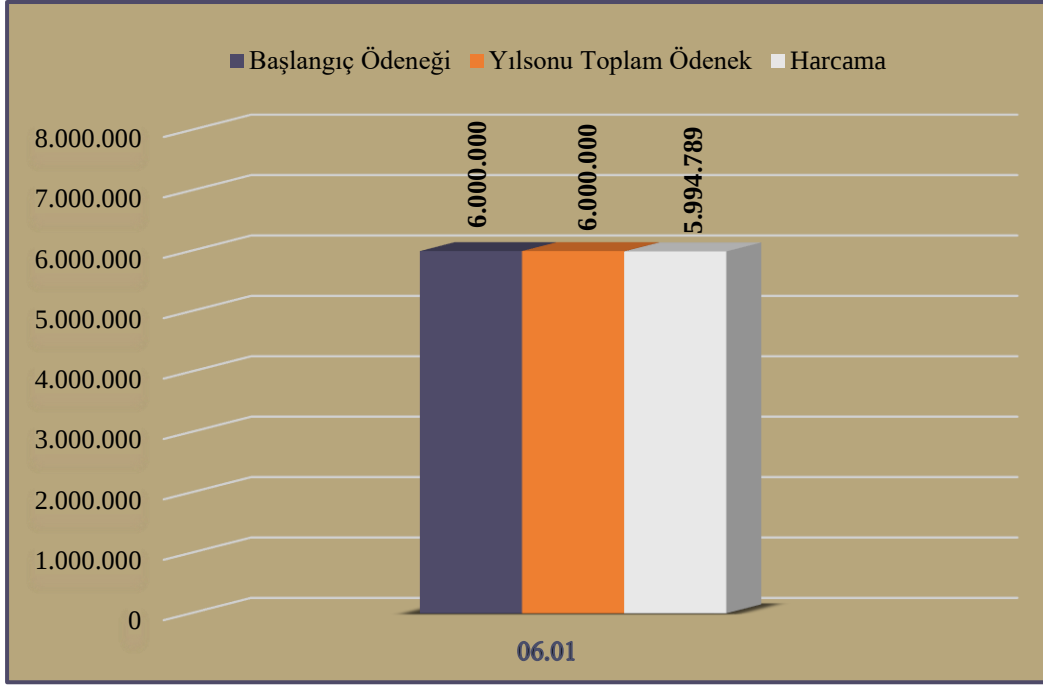

Merkez Kütüphanemiz dermesindeki nitelikli yayın niceliğini arttırmak amacıyla bütçesini, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına orantılı ve dengeli bir biçimde paylaştırdığı gözlemlenmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2024 yılı içinde aşağıdaki iş kollarında düzenli bir şekilde hizmet vermiştir:

- Basılı bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, kataloglama işlemlerinin yapılması, etiketlenmesi, RFID çiplerinin takılması, raflara yerleştirilerek hizmete sunulması,
- Akademik personelimizin elektronik ortamda erişim sağlayamadığı makalelerin, tezlerin, vb. bilgi kaynaklarının araştırılarak bulunması ve sağlanması,
- Bilimsel Açık Erişim Arşivi hizmetlerinin yürütülmesi, sisteme tez ve veri girişlerinin yapılması,
- Kurum arşiv çalışmalarının yürütülmesi,
- Enstitülerimize ve Akademik Personellerimize Turnitin, iThenticate ve İntihal.net intihal tespit programları kullanıcı hesaplarının açılması ve teknik destek sağlanması,
- Sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında tüm kullanıcılarımıza danışma hizmeti verilmesi, teknik destek sağlanması,
- Uzaktan erişim hizmetlerinin (VPN, Kütüphane Hesabım, vb.) sağlanması konusunda teknik destek sağlanması, bilgilendirme yapılması,
- Etkinlikler, kullanıcı eğitimleri, güncel duyuru ve haberler ile kütüphane kullanıcılarının bilgilendirilmesi,
- Birim kalite hedefleri çerçevesinde PUKO çalışmaları ve toplantıların yapılması.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı her yıl aralık ayında akademik birimlerce talep edilen veri tabanlarının fayda maliyet analizlerini yaparak Kütüphane Komisyonuna sunmaktadır. Kütüphane Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda hizmete sunulacak veritabanları belirlenmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında abonelik sağlanan veri tabanları aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ American Chemical Society (ACS)
- ✓ ARTstor Digital Library
- ✓ AYEUM
- ✓ Bookcites Atıf Dizini
- ✓ CABI eBooks
- ✓ Clinical Key
- ✓ Cochrane Library
- ✓ Dar Almandumah (Mandumah Dissertations paketi)
- ✓ eOsmanlıca
- ✓ HiperKitap
- ✓ IGI Global
- ✓ İdeal Online
- ✓ Kelime.com
- ✓ Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası
- ✓ Mango Languages
- ✓ Nursing Core Collection
- ✓ Nursing Current Concepts
- ✓ Oxford Grove Art Online
- ✓ Piri Keşif Aracı
- ✓ Sage Premier Journals
- ✓ SOBİAD
- ✓ Sport Discus
- ✓ Taylor & Francis eBooks
- ✓ Turcademy
- ✓ UpToDate
- ✓ Vidobu
- ✓ Wikilala
- ✓ World Cinema
- ✓ World Ebook Library

Ayrıca veri tabanlarının yanında basılı kaynaklar kapsamında 2476 adet basılı yayın (kitap) alımı gerçekleştirilmiştir.

3.4. 2024H03-233017 / ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, müstakil bir proje olarak 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer almakta olup, başlangıçta 200.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içinde Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden yapılan revizyonlarla birlikte proje ödeneği 5.250.000 TL'ye yükseltilmiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla projeden toplam 2.250.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında, İlahiyat Fakültesi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan revizyon talebi doğrultusunda proje bütçesi 195 milyon TL olarak güncellenmiş ve kapalı alanı 6.500 m² olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yeni uygulama projelerine ihtiyaç duyulmuş ve 23 Temmuz 2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibarıyla proje tamamlanmış olup, KDV dâhil 1.596.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ordu Üniversitesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında, Ordu Üniversitesi'ne bağlı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1.000 m² kapalı alana sahip bir eğitim binasının inşa edilmesine yönelik bir protokol imzalanmıştır.

Bu doğrultuda, ilgili yatırım projesinin Yatırım Programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına başvuruda bulunulmuş ve yapılan talep 20 Eylül 2024 tarihinde uygun görülerek yatırım programına dâhil edilmiştir.

Yatırım programında, proje maliyetinin 25.000.000 TL'lik kısmının İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.


Projenin yatırım programına alınmasının ardından, uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik hizmet alımı gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda KDV dâhil 654.000 TL ödeme yapılmıştır.

Söz konusu projeler kapsamında yürütülen çalışmalar, belirlenen plan ve bütçe doğrultusunda devam etmektedir.

3.5. 2020H03-152051 / KAMPÜS ALTYAPISI

2024 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde revize işlemleri yapılarak sektör içerisindeki diğer yatırım projelerine 5.250.000 TL ödenek aktarılmıştır. Geriye kalan 9.750.000 TL ödeneğin aralık sonu itibarıyla %97,69'u harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımıyla finanse edilmektedir.

Grafik 6. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

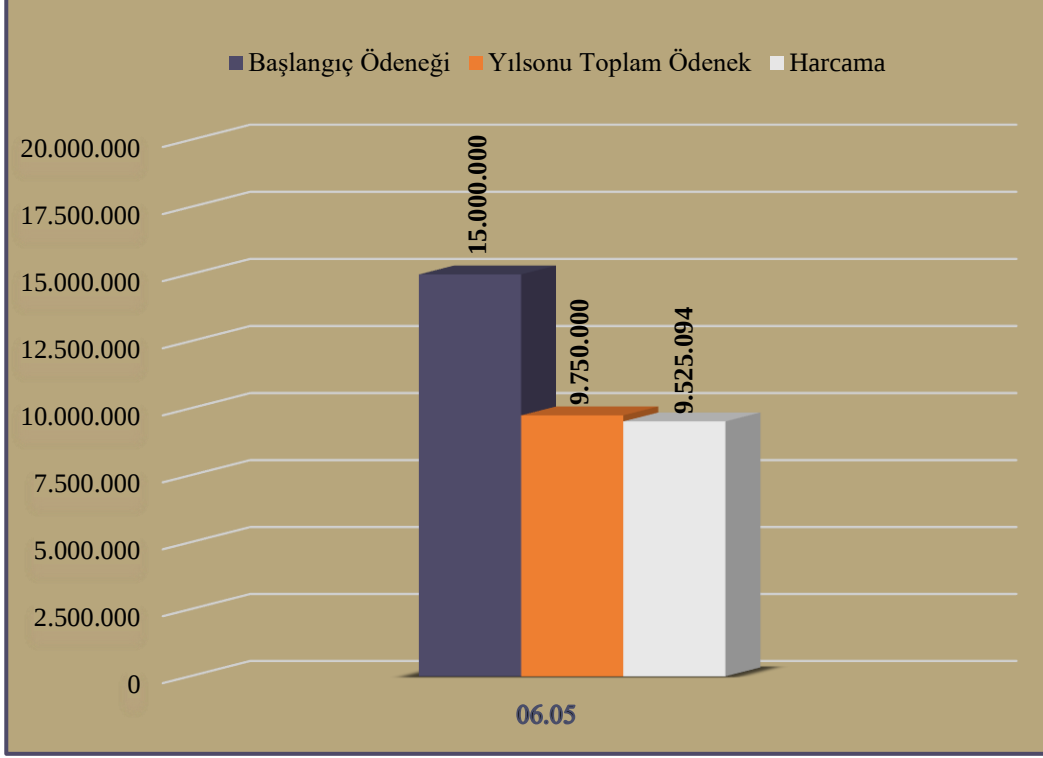

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Yıl içerisinde Cumhuriyet yerleşkesi ve diğer yerleşkelerin peyzaj ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması için çeşitli sözleşmeler imzalanmıştır. Bu proje kapsamında;

1. Cumhuriyet Yerleşkesi ve Ziraat Fakültesi Serası Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri Yapılması işi,
2. Ordu Üniversitesi Sıfır Atık Depolama Alanı Yapım işi,
3. Ünye MYO Doğalgaz Dönüşüm işi,
4. Cumhuriyet Yerleşkesi Yol ve Otopark Yapım işi proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ünye MYO Doğalgaz Dönüşüm İşi



Cumhuriyet Yerleşkesi Yol ve Otopark Yapım İşi





Cumhuriyet Yerleşkesi Ziraat Uyg. Serası Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapılması İşi



3.6. 2024I00-227374 / MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK SEKTÖRÜ)

Müstakil bir proje olup 2024 yılı ödeneği 8.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde ödenek durumunda herhangi bir revizyon işlemi yapılmamış olup 6.545.523 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, toplam ödeneğin %81,82'si harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımıdan finanse edilmektedir.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Yıl içerisinde Diş Hekimliği Fakültesinin sağlık altyapı hizmetlerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi konusunda faaliyetlerimiz planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında;

1. Diş üniti alımı,
2. Tıbbi cihaz ve malzeme alımı,
3. Kliniklerimizde kullanılmak üzere yorgan alımı,
4. Ameliyathane dolabı ve mayo masası alımı,
5. Çalışma koltuğu ve kanepeler alımı,
6. Tarayıcı alımı,
7. Kompakt arşiv dolabı, dosya dolabı ve soyunma dolabı alımı,
8. Tümlerik bilgisayar alımı,
9. Projeksiyon cihazı alımı,
10. Fosfor plak tarayıcısı alımı,
11. Lazer yazıcı, defibrilatör ve televizyon alımı.

3.7. 2024K12-233956 / REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Müstakil bir proje olup 2024 yılı başlangıç ödeneği 832.000 TL'dir. Yıl içerisinde ödenek durumunda herhangi bir revizyon işlemi yapılmamış olup herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Proje ödeneği öz gelirlerden finanse edilmektedir.

III. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemizin altyapı ve akademik gelişimini destekleyen yatırımların daha etkin şekilde yürütülebilmesi için bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım bütçeleri belirlenirken üniversitemizin öncelikleriyle stratejik hedeflerinin daha fazla gözetilmesi, kaynakların verimli kullanımı açısından önemlidir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödenek tahsislerinde destekleyici planlamalara gidilmelidir.

Ayrılan ödeneklerin yılın ilk aylarında serbest bırakılması ve üniversitelere belirli oranda esneklik sağlanması, projelerin zamanında tamamlanmasına katkı sunacaktır. İhale süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilebilmesi için mevzuatta süreci hızlandıracak düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Döviz kuru dalgalanmalarının, yurtdışı alımları ve teknik donanım teminini olumsuz etkilememesi için yatırım bütçelerinin bu değişkenliğe duyarlı şekilde planlanması, ayrıca ortak kullanımda olan veri tabanları gibi kalemlerin merkezi alım yoluyla temin edilmesi kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

Yatırım süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kurum uzmanlarının aktif katkısı ile yerinde gözlem ve bilgi paylaşımı sağlanması, karar alma süreçlerini destekleyecektir. Ayrıca, özellikle sağlık alanında hizmet sunan akademik birimlerin donanım ve personel ihtiyaçlarının hızlı karşılanması da hizmet kalitesi açısından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, yatırım süreçlerinin daha etkili yürütülmesi için bütçe, ihale, kur etkisi ve insan kaynağı başlıklarında yapılacak iyileştirmeler üniversitemizin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

IV. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO

Kurum Adı: Ordu Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2024 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaş.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		378.000			5.380			75.000			67.500			46.309
Sağlık	1		8.000			0			8.000			8.000			6.546
D. Kamu Hiz.	1		832			0			832			832			0
- Sosyal	1		832			0			832			832			0
TOPLAM	7		386.832			5.380			83.832			76.332			52.855

V. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI PROJE BAZLI TABLO

Sektör	Proje Adı	İlçesi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Proje Bedeli	Yılı Ödeneği	Toplam Ödenek (Ekleme/Aktarma Dahil)	Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı	Yıl İçi Harcama	Toplam Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Altınordu	2024	2024	Bitti	200.000	200.000	5.250.000	0	2.250.000	2.250.000	43,00
Eğitim	Kampüs Altyapısı	Altınordu	2020	2025	Devam Ediyor	28.000.000	15.000.000	9.750.000	5.331.066	9.525.094	14.856.160	53,00
Eğitim	İlahiyat Fakültesi	Altınordu	2021	2026	Devam Ediyor	195.000.000*	10.000.000	2.500.000	0	0	0	0,00
Eğitim	Muhtelif İşler	Altınordu	2024	2024	Bitti	43.800.000	43.800.000	44.000.000	0	28.539.378	28.539.378	65,00
Eğitim	Yayın Alımı	Altınordu	2024	2024	Bitti	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	5.994.789	5.994.789	100,00
Sağlık	Muhtelif İşler	Altınordu	2024	2024	Bitti	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	6.545.523	6.545.523	82,00
DKH - Sosyal	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Altınordu	2024	2024	Bitti	832.000	832.000	832.000	0	0	0	0,00
TOPLAM						281.832.000	83.832.000	76.332.000	5.331.066	52.854.784	58.185.850	20,65

* İlahiyat Fakültesi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan revizyon talebi doğrultusunda proje bütçesi 195 milyon TL olarak güncellenmiştir.



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

