

2025 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



ORDU ÜNİVERSİTESİ

Mart 2026

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	1
2. KURULUŞUN MEVCUT KAPASİTESİ	2
Tarihçe.....	2
Genel Tanıtım.....	2
3. HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	6
II. PROJE BİLGİLERİ	6
1. GENEL BİLGİLER	6
2. SEKTÖR BAZINDA PROJE BİLGİLERİ	6
2.1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ:.....	6
2.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ:	7
2.3. DKH (SOSYAL) SEKTÖRÜ:	7
3. PROJE BAZINDA HARCAMA BİLGİLERİ	7
3.1. 2025H03-25837 / MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM SEKTÖRÜ)	7
3.2. 2021H03-168407 / DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	18
3.3. 2025H03-258370 / YAYIN ALIMLARI	20
3.4. 2025H03-25836 / ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	21
3.5. 2020H03-152051 / KAMPÜS ALTYAPISI	22
3.6. 2025I00-240515 / MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK SEKTÖRÜ)	25
3.7. 2025K12-259928 / REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	25
III. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER ... 26	
IV. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO	27
V. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI PROJE BAZLI TABLO	28

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Projelerin Başlangıç ve Yılsonu Ödeneği	1
Tablo 2: Projelerin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı	1
Tablo 3: Açık ve Kapalı Hizmet Alanları (m ²)	3
Tablo 4: Arazilerin Mülkiyet Durumu.....	4
Tablo 5: Toplantı ve Konferans Salonları	4
Tablo 6: Yemekhane Sayıları.....	5
Tablo 7: Spor Tesisleri.....	5
Tablo 8: Bilgi Kaynakları Tablosu	5
Tablo 9: Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri.....	8
Tablo 10: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	8

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1. Arazilerin Mülkiyet Durumu.....	4
Grafik 2. Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL).....	6
Grafik 3. Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri.....	8
Grafik 4. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	9
Grafik 5. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	20
Grafik 6. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı	22



"En önemli ve verimli vazifelerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

K. Atatürk

SUNUŞ:

Ordu Üniversitesi olarak, akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi her geçen gün daha ileri taşıyarak, yerelden ulusala ve uluslararası düzeyde etkin bir rol üstlenmeyi temel hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Bilgi üreten, toplumsal kalkınmaya öncülük eden ve günün gereklerine uyum sağlayan dinamik bir yapıyla, öğrencilerimize ve topluma en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz.

Kuruluşundan itibaren yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlama sorumluluğuyla da öne çıkan Üniversitemiz; yürüttüğü bilimsel araştırma projeleri, güçlü akademik kadrosu ve çağdaş altyapı olanaklarıyla gelişimini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, ileri teknoloji ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarımız aracılığıyla öğrencilerimize nitelikli ve uygun bir eğitim-öğretim ortamı sunmayı amaçlamaktayız.

Bu bağlamda, Üniversitemizin fiziksel altyapısının güçlendirilmesi ve akademik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilen yatırım bütçe ödenekleri, ilgili mevzuat çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bu kaynakların kullanımına ilişkin düzenli raporlar hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesi gereğince hazırlanan 2025 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, üniversitemizin gerçekleştirdiği yatırım faaliyetlerini ve bütçe kullanımını şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla sunarım.

Prof. Dr. Orhan BAŞ
Rektör

I. GENEL DEĞERLENDİRME

1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Yükseköğretim Kurumları arasında yer alan Üniversitemizin yatırımları; Hazine Yardımı ve Öz Gelir kaynaklarından finanse edilmektedir.

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerin;

- ✓ Başlangıç ödeneklerini,
- ✓ Yıl sonu toplam ödeneklerini,
- ✓ Finansman kaynaklarını gösteren bilgilerin yer aldığı tablolar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1: Projelerin Başlangıç ve Yılsonu Ödeneği

Sektör / Alt Sektör	Adet	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	5	152.200.000	212.200.000
SAĞLIK / SAĞLIK	1	8.000.000	8.000.000
DKH-SOSYAL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	1	1.189.000	1.189.000
TOPLAM	7	161.389.000	221.389.000

Tablo 2: Projelerin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

Sektör / Alt Sektör	Adet	Hazine Yardımı	Öz Gelir
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	5	152.000.000	-
SAĞLIK / SAĞLIK	1	8.000.000	-
DKH-SOSYAL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	1	-	1.189.000
TOPLAM	7	160.000.000	1.189.000

2. KURULUŞUN MEVCUT KAPASİTESİ

Tarihçe

Ordu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fatsa Meslek Yüksekokulu, Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi ve Ordu Meslek Yüksekokulu ile birlikte kuruluş kanunu kapsamında; Tıp Fakültesi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin de eklenmesiyle 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur.

Ordu Üniversitesi bünyesinde 04.02.2008 tarihinde Akkuş Meslek Yüksekokulu, 15.09.2008 tarihinde Ulubey Meslek Yüksekokulu, 25.03.2009 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi, 25.04.2009 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi, 26.02.2010 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 31.03.2011 tarihinde İkizce Meslek Yüksekokulu, 04.04.2011 tarihinde Eğitim Fakültesi, 05.05.2011 tarihinde Aybastı Meslek Yüksekokulu, 05.01.2012 tarihinde Gölköy Meslek Yüksekokulu, 24.05.2012 tarihinde İlahiyat Fakültesi, 05.07.2012 tarihinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.07.2012 tarih ve 30876 sayılı yazısı gereğince Ordu Meslek Yüksekokulu'nun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir birim açılmış ve Ordu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki sosyal bilimler ağırlıklı bölümler Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna devredilmiştir. 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış aynı sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu açılmıştır. 18 Mart 2022 tarih ve 31772 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5259 sayılı karar ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış yerine Spor Bilimleri Fakültesi açılmıştır. 09.05.2023 tarihinde Perşembe Meslek Yüksekokulu, 11.05.2023 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 18.05.2023 tarihinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi açılmıştır.

Ordu Üniversitesi, genç olmakla beraber bölgenin iki büyük üniversitesinin, başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş, yeterli tecrübe birikimine sahip; bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara odaklı çalışma prensibi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Genel Tanıtım

Ordu Üniversitesi, 2006 yılında Ondokuz Mayıs ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri'nin köklü akademik geçmişlerinden güç alarak kurulmuş dinamik bir eğitim kurumudur. Gençliğin enerjisi ile olgunluğun tecrübesini harmanlayarak, akademik ve sosyal alanda kendine özgü bir kimlik geliştirmiştir.

Üniversitenin amacı, mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının kalitesini daha da yükseltmek ve eksik programları akademik, teknik ve fiziksel açıdan güçlendirerek eğitim vermeye hazırlamaktır. Eğitim programları, sektörle iş birliği içinde, bilimsel gereksinimlerin yanı sıra sektör ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Ayrıca, uluslararası alanda öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmak için çeşitli üniversitelerle yapılan anlaşmalar da önemli bir yer tutmaktadır.

Üniversitenin altyapı koşulları sürekli olarak geliştirilmektedir; öğrenciler için kablosuz internet, online kütüphane ve uzaktan eğitim gibi olanaklar sağlanmaktadır. Sosyal yaşam, 50'den fazla öğrenci kulübü ve topluluğu ile zenginleştirilmiş ve yerleşke içinde aktif bir şekilde sürdürülmektedir.

Ordu'nun eşsiz doğası ve temiz havası içinde yer alan üniversite, şehir merkezi ile de bütünleşerek, öğrencilere doğal bir yaşam alanı sunmaktadır.


Tablo 3: Açık ve Kapalı Hizmet Alanları (m²)		
Birim Adı	Kapalı Alan	Açık Alan
Rektörlük	13.570	1.154.528
Yabancı Diller Yüksekokulu - Eğitim ASM	5.135	
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok	8.320	
Fen Edebiyat Fakültesi B Blok + İlahiyat Fakültesi	7.471	
Ziraat Fakültesi + Sağlık Bilimleri Fakültesi	13.538	
Diş Hekimliği Fakültesi	14.658	
Eğitim Fakültesi + Güzel Sanatlar Fakültesi	11.433	
Spor Bilimleri Fakültesi	9.060	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.347	
Morfoloji Binası	16.052	
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi	11.466	
Mesudiye Meslek Yüksekokulu	932	
Ünye Meslek Yüksekokulu	4.317	
Fatsa Meslek Yüksekokulu	2.213	
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi	3.445	
Ulubey Meslek Yüksekokulu	1.227	
Akkuş Meslek Yüksekokulu	1.175	
İkizce Meslek Yüksekokulu	3.857	
Aybastı Meslek Yüksekokulu	470	
Gölköy Meslek Yüksekokulu	1.050	
Turizm Fakültesi	1.932	
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	4.120	
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	7.013	
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.356	
Turizm Uygulama Restoranı	396	
Kafeterya + Soyunma odaları	410	
Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi	3.760	
Kreş	1.642	
Sosyal Yaşam Merkezi	189	
İlave Eklentiler	7.294,76	
Toplam Alan	164.848,76	1.154.528,13

Ordu Üniversitesinin taşınmaz varlıklarının yerleşke bazında; üniversite, hazine ve diğer arazilere göre dağılımını gösteren Tablo 4 aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: Arazilerin Mülkiyet Durumu

Yerleşke Adı	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam
Cumhuriyet Yerleşkesi	689.325	-	-	689.325
Akkuş Yerleşkesi	-	17.581	-	17.581
Aybastı Yerleşkesi	470	-	-	470
Altınordu Yerleşkesi	60.804	19.842	-	79.949
Fatsa Yerleşkesi	410	131.858	-	132.268
Gölköy Yerleşkesi	1.050	-	-	1.505
Gülyalı Yerleşkesi	6.769	-	-	6.769
İkizce Yerleşkesi	4.128	-	-	4.128
Kumru Yerleşkesi	6.709	-	-	6.709
Mesudiye Yerleşkesi	-	15.403	-	15.403
Ulubey Yerleşkesi	8.916	7.541	-	16.457
Ünye Yerleşkesi	9.630	8.134	165.958	183.722
TOPLAM	788.211	200.359	165.958	1.154.528

Grafik 1. Arazilerin Mülkiyet Durumu

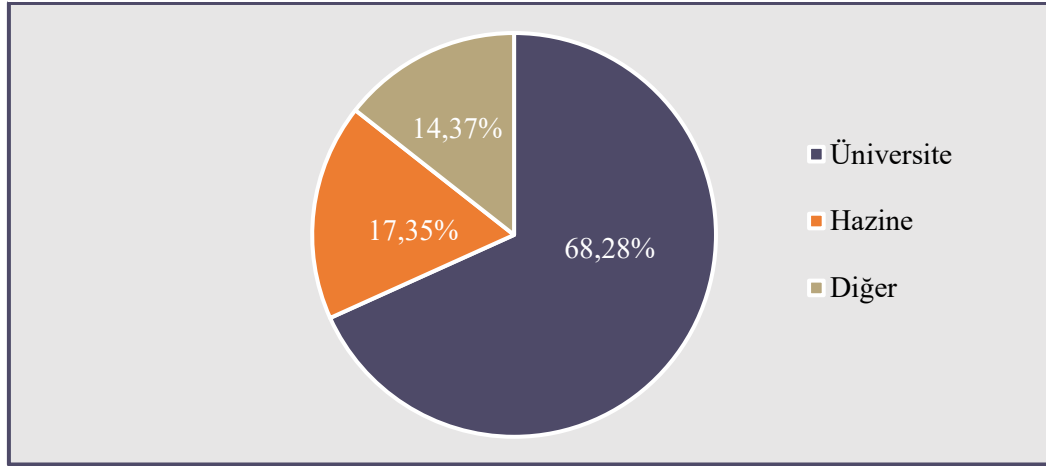

Tablo 5: Toplantı ve Konferans Salonları

Kapasite	Adet	Alan (m ²)
0 – 50 kişi	23	1.049
51 – 75 kişi	11	467
76 – 100 kişi	4	306
101 – 150 kişi	4	646
151 – 250 kişi	4	778
251 kişi ve üzeri	3	2308
Toplam	49	5.554

Tablo 6: Yemekhane Sayıları

Yerleşke Adı	Adet	Alan (m ²)	Kapasitesi
Cumhuriyet Yerleşkesi	4	1.750	1.330
Akkuş Meslek Yüksekokulu	1	123	60
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi*	1	150	150
İkizce Meslek Yüksekokulu	1	120	94
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	2	250	154
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2	270	220
Turizm Fakültesi	1	50	50
Ulubey Meslek Yüksekokulu	1	100	50
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	2	588	356
Ünye Meslek Yüksekokulu	2	300	160
Toplam	17	3.701	2.624

*Fatsa MYO ile ortak kullanılmaktadır.

Tablo 7: Spor Tesisleri

Yerleşke Adı	Açık Alan	Kapalı Alan	Adet	Alan (m ²)
Cumhuriyet Yerleşkesi	3	1	4	6.369
Akkuş Meslek Yüksekokulu	1	-	1	350
Fatsa Yerleşkesi	3	-	3	2.167
İkizce Meslek Yüksekokulu	1	-	1	540
Mesudiye Meslek Yüksekokulu	1	-	1	540
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1	-	1	510
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2	-	2	822
Ulubey Meslek Yüksekokulu	1	-	1	120
Ünye Yerleşkesi	2	1	3	3.812
Toplam	16	2	18	15.230

Tablo 8: Bilgi Kaynakları Tablosu

Tür	Sayı
Basılı Kitap Sayısı	97.648
Katalogsuz Kitap Sayısı	0*
Elektronik Kitap Sayısı (Abone Olunan)	405.506
Elektronik Kitap Sayısı (Satın Alınan)	22.980
Basılı Süreli Yayın Sayısı	12.745
Elektronik Süreli Yayın Sayısı (Abone Olunan)	37.530
Toplam	576.409

*Kataloglama çalışmaları tamamlanarak tüm materyaller kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

3. HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2025 yılı içerisinde tamamlanan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Ek Binası, protokol kapsamında şartlı bağış olarak gerçekleştirilmiş ve taşınmaz malların kapasitesine yaklaşık 1.000 m² kapalı alan eklenmiştir.

II. PROJE BİLGİLERİ


1. GENEL BİLGİLER

2025 Yılı Yatırım Programında Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 5 tanesi Eğitim Sektörü, 1 tanesi Sağlık Sektörü, 1 tanesi de DKH(Sosyal) Sektöründe olmak üzere toplam 7 tanedir.

Üniversitemize 2025 Yılı Yatırım Programında yılı ödeneği olarak 161.389.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizeler sonucunda ödenek tutarı 221.389.000,00 TL olmuştur.

Revize ödeneğin kamulaştırma dâhil 158.511.623,67 TL'si harcanmış olup %71,60 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Grafik 2. Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL)

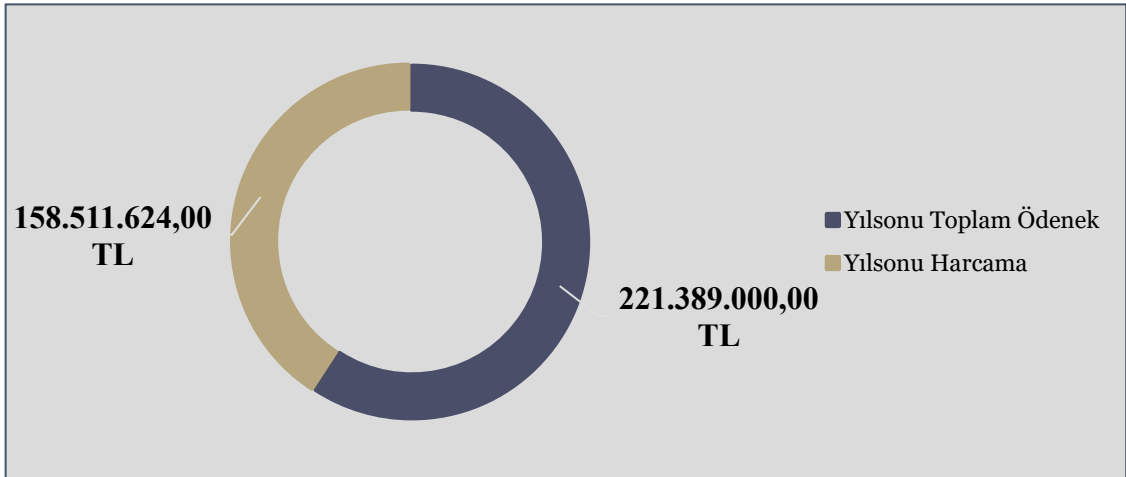

2. SEKTÖR BAZINDA PROJE BİLGİLERİ

2.1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 5 tanesi Eğitim Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numaraları ve Adları

- ✓ 2025H03-25837 / Muhtelif İşler Projesi
- ✓ 2021H03-168407 / Derslik ve Merkezi Birimler
- ✓ 2025H03-258370 / Yayın Alımları
- ✓ 2020H03-152051 / Kampüs Altyapısı
- ✓ 2025H03-258368 / Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Hazine yardımı ile yürütülen eğitim sektörü projeleri kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 152.200.000,00 TL başlangıç ödeneğine ekleme/aktarma bütçe işlemleri yapılarak toplam ödenek 212.200.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 150.267.307,60 TL'si harcanmış olup %70,81 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 1 tanesi Sağlık Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numarası ve Adı

- ✓ 2025I00-240515 / Muhtelif İşler Projesi

Hazine yardımı ile yürütülen bir proje olup, bu kapsamda Üniversitemize tahsis edilen 8.000.000 TL başlangıç ödeneğinin 7.055.316,07 TL'si harcanmıştır. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ya da aktarma işlemi yapılmamış olup nakdi gerçekleşme oranı %88,19 olarak gerçekleşmiştir.

2.3. DKH (SOSYAL) SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin sorumlu olduğu projelerden 1 tanesi DHK (Sosyal) Sektöründe yer almaktadır.

Proje Numarası ve Adı

- ✓ 2025K12-259928 / Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanan yatırım projesi için Üniversitemize tahsis edilen 1.189.000 TL kesintili başlangıç ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme ya da aktarma işlemi yapılmamış olup nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

3. PROJE BAZINDA HARCAMA BİLGİLERİ

3.1. 2025H03-25837 / MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM SEKTÖRÜ)


Muhtelif İşler Projesi toplu proje olup karakteristiğinde; Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Makine Teçhizat alımları yer almaktadır.

2025 yılı başlangıç ödeneği 48.345.000 TL'dir. Yıl içerisinde aktarma bütçe işlemleri sonrasında toplam proje ödeneği, 500.000 TL azalarak 47.845.000 TL olmuştur. Toplam ödeneğin 30.426.575,69 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %63,59 olarak gerçekleşmiştir. Proje ödeneği hazine yardımıyla finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin karakteristiğine göre başlangıç ve yılsonu ödeneklerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir.


Tablo 9: Karakteristik Özelliklere Göre Ödenek Bilgileri

Karakteristik Özelliği	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
Bakım Onarım	18.980.000	16.480.000	13.424.753
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	6.515.000	6.190.000	3.076.357
Makine Teçhizat Alımları	22.850.000	25.175.000	13.925.466
Toplam	48.345.000	47.845.000	30.426.576

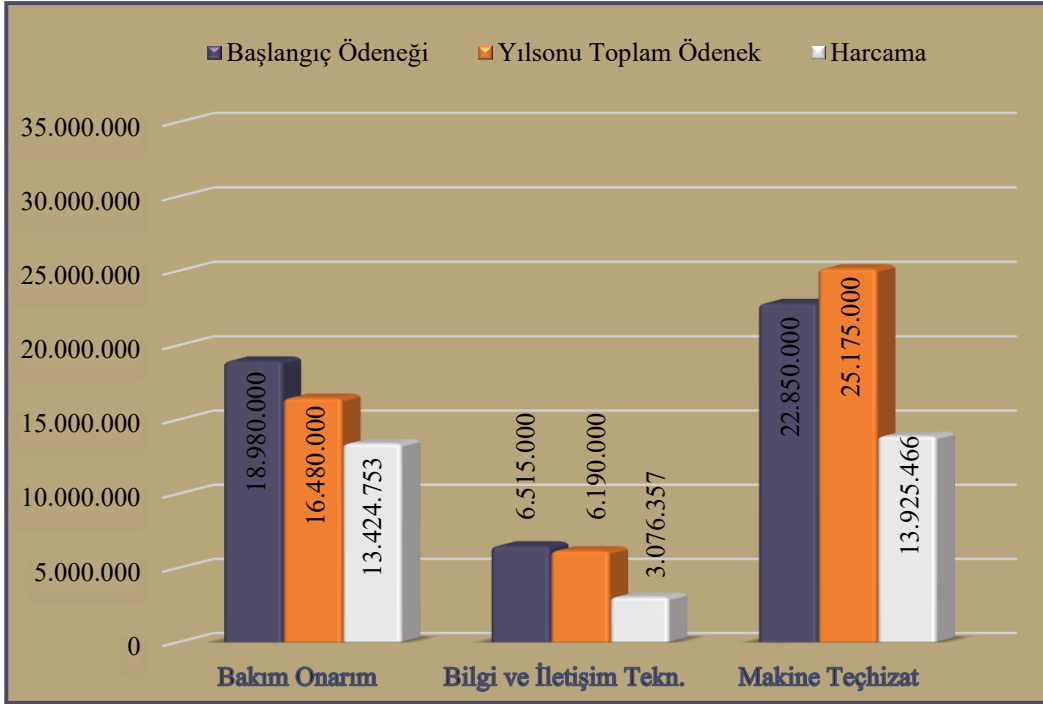Grafik 3. Karakteristik Özelliklerine Göre Ödenek Bilgileri**Tablo 10: Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı**

Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama
06.01	Mamul Mal Alımları	22.850.000	25.175.000	13.925.466
06.03	Gayrimaddi Hak Alımları	6.515.000	6.190.000	3.076.357
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	3.980.000	5.480.000	5.020.483
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.000.000	11.000.000	8.404.270
	Toplam	48.345.000	47.845.000	30.426.576

Grafik 4. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

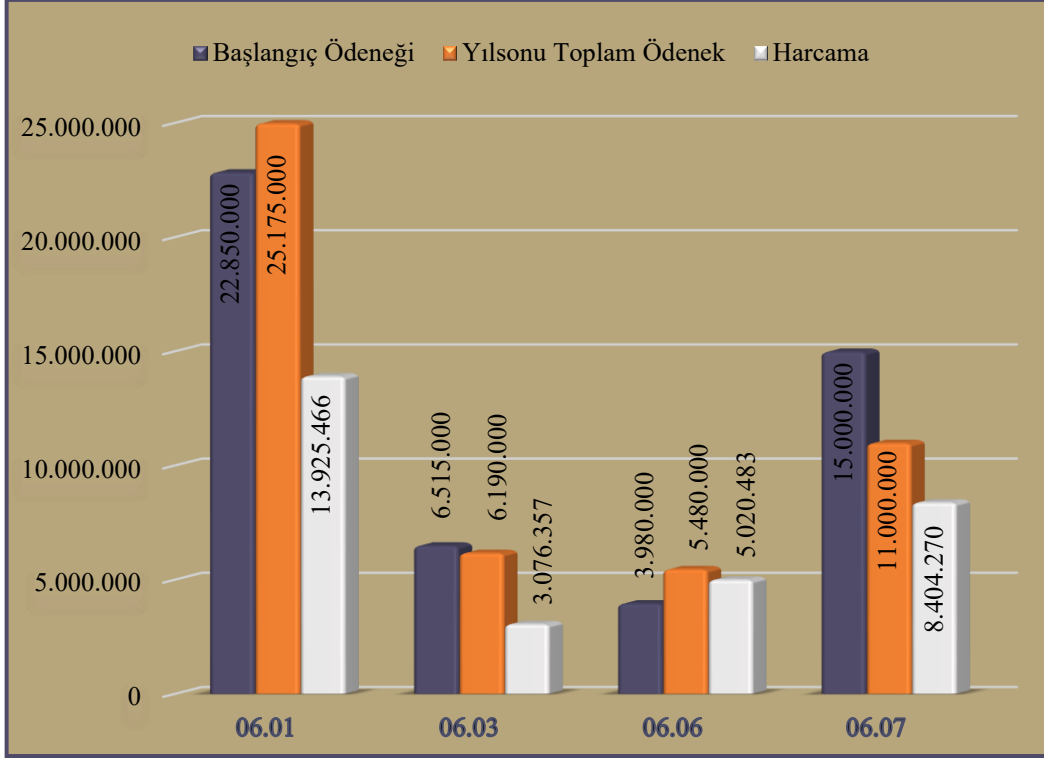

Yatırım harcamaları ekonomik kod bazında değerlendirildiğinde harcamalar içerisinde en büyük pay %45,76 oran ile “06.01-Mamul Mal Alımları” ekonomik koduna aittir.

En küçük pay ise %10,12 ile “06.03-Gayrimaddi Hak Alımları” ekonomik koduna aittir.

“06.06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri” kapsamında toplam 5.480.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla ödenek 5.020.483 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam proje ödenekleri içerisindeki payı %16,50’dir.

“06.07-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” kapsamında ise toplam 11.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla ödenek 8.404.270 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam proje ödenekleri içerisindeki payı %27,62 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Kapsamında Yapılan Başlıca İşler

Üniversitemiz birimlerinin eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla çeşitli makine, cihaz ve ekipman alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari birimlerden gelen talepler değerlendirilerek bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaya çalışılmıştır. Yapılan faaliyetlerin işin karakteristik özelliklerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Makine Teçhizat Alımları

Elektronik ve Bilişim Ekipmanları

- 32 adet tümleşik bilgisayar
- 30 adet monitör

- RAM, SSD ve çeşitli bilişim donanımları
- Barkod yazıcı
- Switch cihazları (kenar ve omurga anahtarları)
- Telefon santrali abone kartları
- Kablolu telefon ve konsol telefonu
- Drone ve iş istasyonu
- Sanal gerçeklik gözlüğü
- Baskı makinesi

Ofis ve Mobilya Malzemeleri

- Masa ve sandalye
- Ofis mobilyaları
- Üniversite birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli büro ekipmanları

Güvenlik ve Kontrol Sistemleri

- Kamera sistemleri
- Kamera kayıt cihazları ve depolama diskleri
- Turnike geçiş sistemi kartları ve modülleri
- Kameralı monitör

Temizlik ve Çevre Düzenleme Ekipmanları

- Sırt tırpanı
- Sıfır Atık Ünitesi
- Yer temizleme makinesi ekipmanları

Ses ve Görüntü Sistemleri

- Televizyon ve görüntü sistemleri
- Monitör ve görüntüleme cihazları

Mutfak ve Sosyal Tesis Ekipmanları

- Buzdolabı
- Mikser
- Blender
- Hot plate
- Mutfak robotu
- Çelik su ısıtıcısı

- Tencere ve çeşitli mutfak ekipmanları

İklimlendirme ve Mekanik Ekipmanlar

- Duvar tipi klima
- Su pompası
- Genleşme tankı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Üniversitemizin bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve kurumsal bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli yazılım ve lisans teminleri gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve İdari Sistem Yazılımları

- KABİSO e-Kamu işçi Modülü
- Üniversite Kalite Yönetim Sistemi (UNİKYS) yazılımı

Akademik ve Teknik Yazılımlar

- Çelik Statik Programı
- SPSS istatistik yazılımı

Veri Güvenliği ve Sistem Yönetimi Yazılımları

- SIEM log toplama ve korelasyon sistemi
- Yedekleme yazılımı lisans yenilemesi
- Dosya paylaşım yazılımı abonelik lisansı

Eğitim ve Ölçme-Değerlendirme Yazılımları

- Ölçme Değerlendirme Sistemi yazılım modülleri
- Tıp Fakültesi için yazılım alımı

Bakım Onarım

Üniversitemize ait taşınır ve taşınmaz varlıkların güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi amacıyla bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmüştür.

Menkul Malların Bakım ve Onarım İşleri

Büro ve Bilişim Cihazları Bakım-Onarım İşleri

- Fotokopi makineleri bakım ve yedek parça işlemleri
- Yazıcı bakım, yedek parça temini ve parça değişimleri

Elektronik ve Görüntü Sistemleri Bakım-Onarım İşleri

- Televizyon bakım ve parça temini

Temizlik ve Hizmet Ekipmanları Bakım-Onarım İşleri

- Yer temizleme makinesi bakım ve parça temini

Haberleşme ve Enerji Sistemleri Bakım-Onarım İşleri

- Telefon santralleri bakım ve onarımı
- Kesintisiz güç kaynakları (UPS) bakım ve onarımı

Gayrimenkul Malların Bakım ve Onarım İşleri

Mekanik Tesisat Bakım-Onarım İşleri

- Kazan dairelerinde meydana gelen arızaların giderilmesi ile kazan ve kalorifer tesisatına ait cihazların bakım ve onarım işleri
- İklimlendirme, havalandırma ve VRF sistemlerinin bakım ve onarım işleri
- Üniversitemize ait asansörlerin periyodik bakım işleri ve gerekli yedek parça temini
- Kazan daireleri ile ısıtma sistemlerine ait muhtelif bakım ve onarım işleri

Elektrik ve Elektronik Tesisat İşleri

- Muhtelif elektrik tesisatı bakım ve onarım işleri
- Kuvvetli akım tesisat işleri
- Yangın algılama ve ihbar sistemleri bakım ve onarım işleri
- Morfoloji binası yangın söndürme tesisatı bakım onarım işi
- Bina otomasyon sistemleri bakım işleri
- Rektörlük binası jeneratörü bakım ve onarım işi

Yapısal Bakım-Onarım İşleri

- Teknik Bilimler MYO çatı onarım işi
- Ziraat Fakültesi teras çatı yalıtım işi
- Akkuş MYO çatı onarım işi
- Ziraat Fakültesi muhtelif çatı onarım işleri
- Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi binası büyük onarım işi
- Ünye MYO kantin onarım işi

Yerleşke Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri

- Sosyal Bilimler MYO çevre aydınlatma tesisatı yapım işi
- Teknik Bilimler MYO çit yapım işi
- Fatsa MYO bölgesel ısıtma tesisatı yenileme işi
- Çeşitli fakülte ve yüksekokullarda oluşan arızaların giderilmesi işleri

Fen Edebiyat Fakültesi 2025 Yılı Bakım Onarım İşleri



Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Çatı Onarımı ve Muhtelif İşler Yapım



Sosyal Bilimler MYO Çevre Aydınlatma Tesisatı Yapılması İŖi



Ziraat Fakültesi Muhtelif Mahallerde Çatı Onarım İŖi



Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Binası Büyük Onarım İŖi

İhale Tarihi : 20.06.2025

Sözleşme Tarihi : 11.07.2025

Sözleşme Bedeli : 1.690.000,00 TL (KDV Hariç)

İŖin Bitim Tarihi : 28.09.2025

Fiziki Durumu : Yapım işinin gerçekleşme oranı % 100 seviyesinde olup, geçici kabul yapılmıştır.



Mesudiye MYO Kazan Dairesi Onarım İŖi



Ünye MYO Kantin Onarım İşi



Akkuş MYO Çatı Onarım İşi



Yalıtımsız Mekanik Ekipmanların Yalıtım İşi



3.2. 2021H03-168407 / DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası, Cumhuriyet Yerleşkesinde 6.500 m² kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilmekte olup, projenin toplam maliyeti 292.500.000 TL'dir. Yapım işinin ihalesi 08.04.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, yüklenici firma ile 06.05.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 07.05.2025 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli 163.380.380,38 TL (KDV hariç) olup, sözleşme hükümleri doğrultusunda işin 500 gün içerisinde tamamlanması planlanmış ve iş bitiş tarihi 18.09.2026 olarak öngörülmüştür.

Proje kapsamında betonarme kaba yapı imalatı tamamlanmış, her iki blokta duvar imalatları bitirilmiştir. Dış cephe iskelesi kurulmuş olup mantolama çalışmalarına başlanılmış, bodrum katta sıva imalatı devam etmektedir. Ayrıca çatı imalatı sürdürülmekte ve yapı çevresine ait istinat duvarları tamamlanmış durumdadır. Mevcut durumda yapım işinde %32 fiziki gerçekleştirme seviyesine ulaşılmıştır.



FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK BİNASI

Üniversitemiz ile İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1.000 m² kapalı alana sahip bir eğitim binasının inşa edilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Söz konusu protokol ile fakülteye ek bir eğitim binası kazandırılarak üniversitemiz altyapısının güçlendirilmesi ve denizcilik eğitimi alan öğrencilerin daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Ordu Üniversitesi Fatsa Denizcilik Eğitim Merkezi Binası, Fatsa ilçesinde 1.000 m² kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilmiştir. Projenin toplam maliyeti 25.546.681,08 TL olup, yapım işinin ihalesi 25.02.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma ile 17.03.2025 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Yapım işi tamamlanarak 28.11.2025 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve proje başarıyla tamamlanmıştır.



MERKEZİ DERSLİK

Ordu Üniversitesi Merkezi Derslik Binası, 5.000 m² kapalı alanlı olarak yatırım programında yer almakta olup projenin toplam tutarı 180.000.000 TL'dir.

Projenin uygulama proje ihalesi 18.03.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, işin geçici kabulü yapılarak proje çalışmaları tamamlanmıştır.


Hazırlanan yaklaşık maliyet çalışmasının ardından, yapım işi için ihaleye çıkılması ve projenin yıllara sâri olarak tamamlanması hedeflenmektedir.

3.3. 2025H03-258370 / YAYIN ALIMLARI

Yayın Alımları Projesi müstakil bir proje olup karakteristiğinde; Basılı Yayın Alımı ve Elektronik Yayın Alımları yer almaktadır.

2025 yılı başlangıç ödeneği 8.000.000 TL'dir. Toplam ödeneğin %99,95'i harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımından finanse edilmektedir.

Grafik 5. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

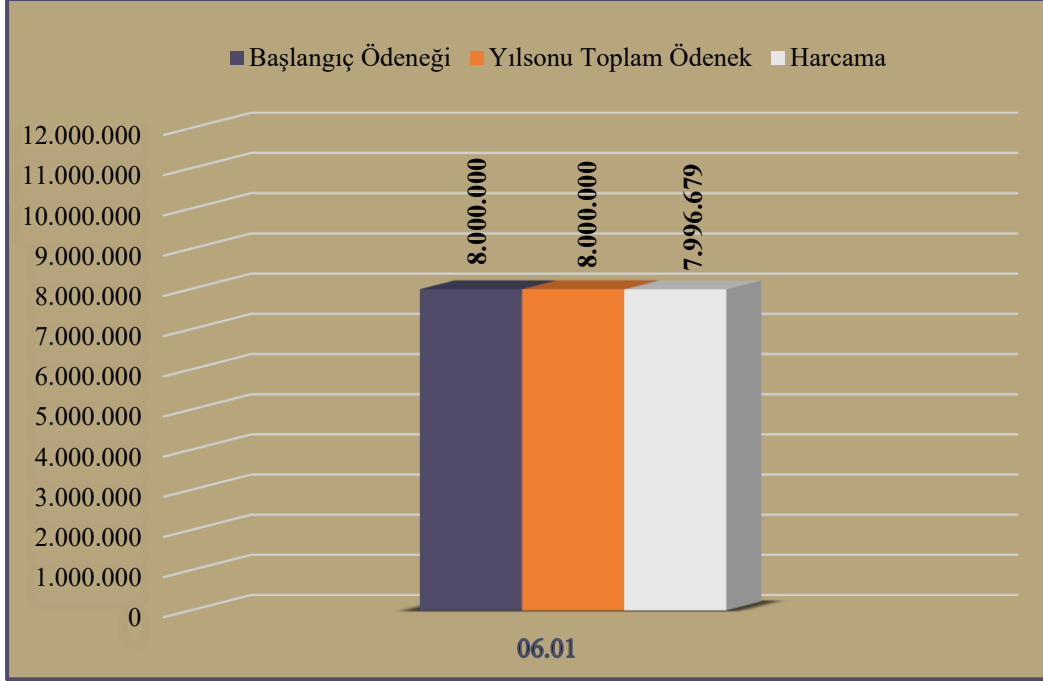

Merkez Kütüphanesinde, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının temini ve kullanıcıların erişimine sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bütçe, basılı ve elektronik bilgi kaynakları arasında paylaştırılarak kullanılmaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür:

- Basılı bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, kataloglanması, etiketlenmesi, RFID çiplerinin takılması ve raflara yerleştirilerek kullanıma sunulması,
- Akademik personelin elektronik ortamda erişim sağlayamadığı makale, tez ve benzeri bilgi kaynaklarının araştırılması ve temin edilmesi,
- Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi kapsamında tez ve veri girişlerinin yapılması ve sistemin işletilmesi,
- Kurum arşiv çalışmalarının yürütülmesi,
- Enstitüler ve akademik personel için Turnitin, iThenticate ve İntihal.net intihal tespit programlarına kullanıcı hesaplarının açılması ve gerekli teknik desteğin sağlanması,
- Kullanıcılara danışma hizmeti verilmesi ve teknik destek sağlanması,
- Uzaktan erişim hizmetleri (VPN, Kütüphane Hesabım vb.) konusunda teknik destek ve bilgilendirme yapılması,
- Etkinlikler, kullanıcı eğitimleri, duyuru ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,

- Birim kalite hedefleri doğrultusunda PUKÖ (Planla–Uygula–Kontrol Et–Önem Al) döngüsüne ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli toplantıların gerçekleştirilmesi.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı her yıl aralık ayında akademik birimlerce talep edilen veri tabanlarının fayda maliyet analizlerini yaparak Kütüphane Komisyonuna sunmaktadır. Kütüphane Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda hizmete sunulacak veritabanları belirlenmektedir. Bu kapsamda 2025 yılında abonelik sağlanan veri tabanları aşağıda belirtilmiştir.

- IGI Global e-Kitapları
- Turcademy
- Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası
- Mango Languages
- Hiperkitap Collection (EBSCO eBook Subscription)
- Infobase Nursing Collection
- Infobase World Cinema
- Elsevier Online Veri Tabanı
- UpToDate
- American Chemical Society (ACS)
- İdeal Online
- Bookcites Atıf Dizini
- SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
- Wikilala Dijital Kütüphanesi
- Kelime.com Sözlükler
- Vidobu
- Piri Keşif Aracı ve Piri AI
- Ayeum Veri Tabanı
- eOsmanlıca Çevrimiçi Eğitim Platformu

3.4. 2025H03-25836 / ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, müstakil bir proje olarak 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer almakta olup, başlangıçta 1.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içinde Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden yapılan revizyonlarla birlikte proje ödeneği 2.500.000 TL'ye yükseltilmiştir. 2025 yılı sonu itibarıyla projeden toplam 2.258.400 TL harcama gerçekleştirilmiştir.


2025 yılında Ordu Üniversitesi Merkezi Derslik Binası projesi Kamu Yatırım Programına alınmıştır. Projeye ilişkin, Merkezi Derslik Binası Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi ihalesi 20.03.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında proje hazırlık sürecine yönelik etüt ve proje ödeneğinden 1.544.400 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Öğrenci Revir Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi ihalesine çıkılablmesini teminen gerekli proje ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda etüt ve proje ödeneğinden 714.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

3.5. 2020H03-152051 / KAMPÜS ALTYAPISI

2025 yılı başlangıç ödeneği 25.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde revize işlemleri yapılarak sektör içerisindeki diğer yatırım projelerine 2.040.000 TL ödenek aktarılmıştır. Geriye kalan 22.960.000 TL ödeneğin aralık sonu itibariyle %73,99'u harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımımdan finanse edilmektedir.

Grafik 6. Proje Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı

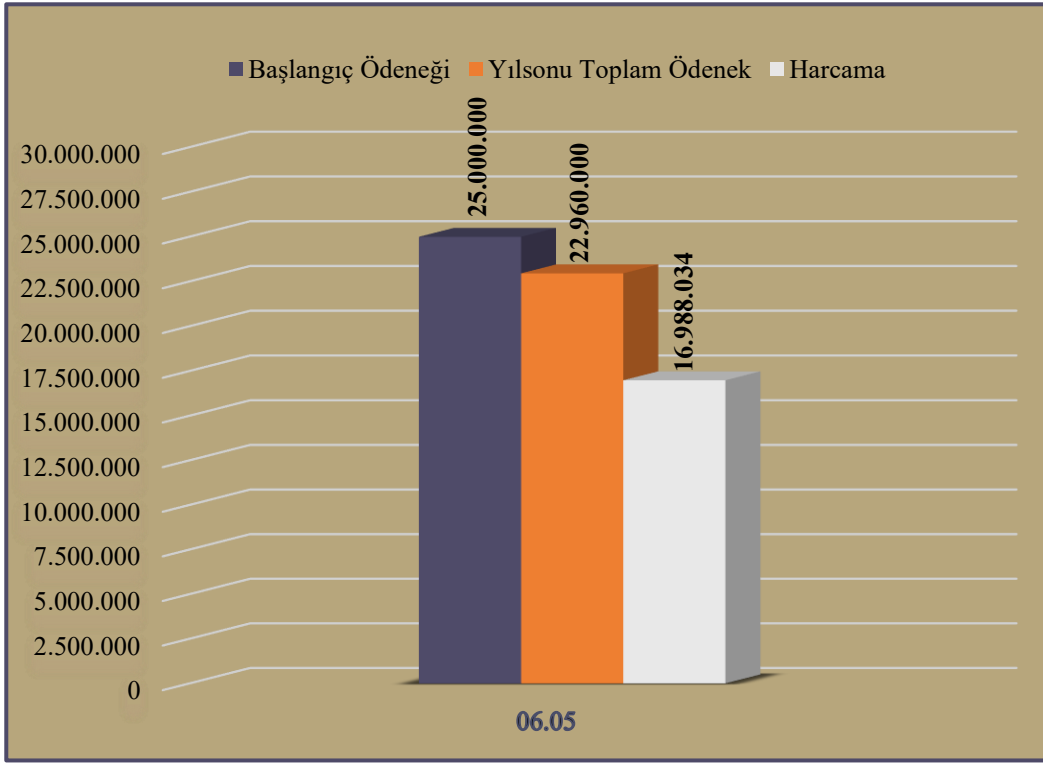

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Yıl içerisinde Cumhuriyet yerleşkesi ve diğer yerleşkelerin peyzaj ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması için çeşitli sözleşmeler imzalanmıştır. Bu proje kapsamında;

- Rektörlük Binası Otopark Yapım İşi
- Öğrenci Revir Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi
- Ziraat Fakültesi Önü Baskı Beton ve Çevre Aydınlatma Yapım İşi
- Cumhuriyet Yerleşkesi Kanalizasyon Hattı Onarım İşi
- Cumhuriyet Yerleşkesi Yaya Kaldırımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
- Merkezi Kantin Çevre Düzenleme İşi

Rektörlük Binası Otopark Yapım İşi

İhale Tarihi : 20.05.2025

Sözleşme Tarihi : 10.06.2025

Sözleşme Bedeli : 2.248.000,00 TL (KDV Hariç)

İşin Bitim Tarihi : 26.07.2025

Fiziki Durumu : Yapım işinin gerçekleşme oranı % 100 seviyesinde olup, geçici kabul yapılmıştır.



Öğrenci Revir Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

- İhale Tarihi** : 19.06.2025
- Sözleşme Tarihi** : 11.07.2025
- Sözleşme Bedeli** : 12.172.000,00 TL (KDV Hariç)
- İşin Bitim Tarihi** : -
- Fiziki Durumu** : Yapım işi devam etmektedir.



Ziraat Fakültesi Önü Baskı Beton ve Çevre Aydınlatma Yapım İşi

- İhale Tarihi** : 10.09.2025
- Sözleşme Tarihi** : 17.10.2025
- Sözleşme Bedeli** : 945.000,00 TL (KDV Hariç)
- İşin Bitim Tarihi** : 04.12.2025
- Fiziki Durumu** : Yapım işinin gerçekleşme oranı % 100 seviyesinde olup, geçici kabul yapılmıştır.



Cumhuriyet Yerleşkesi Kanalizasyon Hattı Onarım İşi



3.6. 2025I00-240515 / MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK SEKTÖRÜ)

Müstakil bir proje olup 2025 yılı ödeneği 8.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde ödenek durumunda herhangi bir revizyon işlemi yapılmamış olup 7.055.316,07 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, toplam ödeneğin %88,19'u harcanmıştır. Proje ödeneği hazine yardımıyla finanse edilmektedir.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Diş Hekimliği Fakültesinin sağlık altyapı hizmetlerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesine yönelik faaliyetler önceden planlanmış olup, söz konusu planlamalar çerçevesinde yıl içerisinde;

1. Diş Üniti Alımı,
2. Barkod Okuyucu,
3. Tümüleşik Bilgisayar Alımı,
4. Işınlı Dolgu Cihazı Alımı,
5. LED Televizyon Alımı,
6. Aspiratör Cihazı Alımı,
7. Mobil Müdahale Lambası Alımı gerçekleştirilmiştir.

3.7. 2025K12-259928 / REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Müstakil bir proje olup 2025 yılı başlangıç ödeneği 1.189.000 TL'dir. Yıl içerisinde ödenek durumunda herhangi bir revizyon işlemi yapılmamış olup ödeneğin tamamı proje desteği kapsamında harcanmıştır. Proje ödeneği öz gelirlerden finanse edilmektedir.

III. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemizin altyapı ve akademik gelişimini destekleyen yatırımların daha etkin şekilde yürütülebilmesi için bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım bütçeleri belirlenirken üniversitemizin öncelikleriyle stratejik hedeflerinin daha fazla gözetilmesi, kaynakların verimli kullanımı açısından önemlidir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödenek tahsislerinde destekleyici planlamalara gidilmelidir.

Ayrılan ödeneklerin yılın ilk aylarında serbest bırakılması ve üniversitelere belirli ölçüde esneklik tanınması, projelerin planlanan takvim çerçevesinde ve etkin bir şekilde tamamlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ihale süreçlerinde özellikle ilan, değerlendirme ve itiraz aşamalarından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla, mevzuatta süreci hızlandırıcı ve uygulamada kolaylık sağlayıcı düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

Döviz kuru dalgalanmalarının yurtdışı alımlar ile teknik donanım temin süreçleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla, yatırım bütçelerinin kur değişkenliğine duyarlı şekilde planlanması önem arz etmektedir. Ayrıca, ortak kullanıma konu veri tabanları gibi kalemlerin, tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde merkezi alım yöntemiyle temin edilebilmesi durumunda, ölçek ekonomisi sağlanarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması mümkün olacaktır.

Yatırım teklifleri oluşturulurken, taleplerin gerçek ihtiyacı yansıtmadığının yerinde gözlem ve veri temelli değerlendirme ile analiz edilmesi, doğru ve etkin karar alınmasını sağlayacaktır. Bu sayede, kurum tarafından iletilen tekliflerin önemi ve öncelik düzeyi daha sağlıklı bir şekilde ortaya konulacak, taleplerin değerlendirilmesi ve onay süreçleri kolaylaşacaktır.

Bu çerçevede, yatırım süreçlerinin daha etkili yürütülmesi için bütçe, ihale ve kur etkisi başlıklarında yapılacak iyileştirmeler üniversitemizin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

IV. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO

Kurum Adı: Ordu Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama		2025 Yılı Program Ödenek		2025 Yılı Revize Ödenek		2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		
Tarım													
Madencilik													
İmalat													
Enerji													
Ulaş.-Hab.													
Turizm													
Konut													
Eğitim	5		597.975			18.130		177.200			212.200		150.267
Sağlık	1		8.000			0		8.000			8.000		7.055
D. Kamu Hiz.	1		1.189			0		1.189			1.189		1.189
- Sosyal	1		1.189			0		1.189			1.189		1.189
TOPLAM	7		607.164			18.130		186.389			221.389		158.512

V. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI PROJE BAZLI TABLO

Sektör	Proje Adı	İlçesi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Proje Bedeli	Yılı Ödeneği	Toplam Ödenek (Ekleme/Aktarma Dahil)	Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı	Yıl İçi Harcama	Toplam Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Altınordu	2025	2025	Bitti	1.000.000	1.000.000	2.500.000	0	2.258.400	2.258.400	90,34
Eğitim	Kampüs Altyapısı	Altınordu	2020	2025	Devam Ediyor	43.130.000	25.000.000	22.960.000	18.130.000	16.988.034	35.118.034	81,42
Eğitim	İlahiyat Fakültesi	Altınordu	2021	2027	Devam Ediyor	292.500.000	29.855.000	86.855.000	0	67.050.707	67.050.707	22,92
Eğitim	Merkezi Derslik	Altınordu	2025	2027	Devam Ediyor	180.000.000	40.000.000	18.000.000	0	0	0	0
Eğitim	Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Ek Binası	Altınordu	2024	2025	Bitti	25.000.000*	25.000.000	26.040.000	0	25.546.911	25.546.911	98,10
Eğitim	Muhtelif İşler	Altınordu	2025	2025	Bitti	48.345.000	48.345.000	47.845.000	0	30.426.576	30.426.576	63,59
Eğitim	Yayın Alımı	Altınordu	2025	2025	Bitti	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	7.996.679	7.996.679	99,96
Sağlık	Muhtelif İşler	Altınordu	2025	2025	Bitti	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	7.055.316	7.055.316	88,19
DKH - Sosyal	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Altınordu	2025	2025	Bitti	1.189.000	1.189.000	1.189.000	0	1.189.000	1.189.000	100,00
TOPLAM						607.164.000	186.389.000	221.389.000	18.130.000	158.511.623	176.641.623	29,09

* Proje maliyetinin 25.000.000 TL'si İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası tarafından karşılanacaktır.



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bütçe Performans Program Müdürlüğü
Mart-2026
ORDU

